

STAND DE TIR DU COURS : Travaux de ventilation pour la salle de tir 25 m

Point chantier au 31 août 2020

VISITE DE CHANTIER DE L'ADJOINT DELEGUE AUX GRANDS TRAVAUX

Mr François Roustan, Adjoint au Maire, délégué (entre autres) aux grands travaux d'infrastructures, est venu ce lundi 31 août pour la visite du chantier du stand de tir.

Les 3 sites impactés ont été visités : salle de boxe, salle de musculation et stand de tir. La problématique d'emprise au sol de la salle de musculation a également été regardée, la réalisation d'un placard technique pour cacher la CTA, comme prévu, sera fait ultérieurement.

Mr Roustan a pu voir l'ampleur des travaux effectués. Le chantier est en pleine action, bien qu'arrivant à sa fin. Tous les corps de métiers se retrouvent à se coordonner pour tenir les délais :

- SRC-BAT pour les faux plafonds,
- SPIE pour installer les pavés led des faux plafonds,
- STME pour finaliser les raccords sur mesures des gaines avec son sous-traitant.

Demain soir les raccords seront tous terminés et le faux plafond dans le stand de tir pourra se finaliser.



Demain fin de matinée, l'association SOLLICITE, viendra débarrasser des choses accumulées par le stand de tir qui n'ont rien à voir avec le chantier mais qui doivent partir en vue de l'inauguration.

La société STME commencera également à débarrasser le chantier.



SALLE DE MUSCULATION - CTA AIR NEUF (INSUFFLATION)

La société STME a fourni le plan d'encombrement de la CTA avec gaines entrée/sortie et nous l'avons transmis au service des sports afin que le service puisse travailler sur une implantation différente des machines.

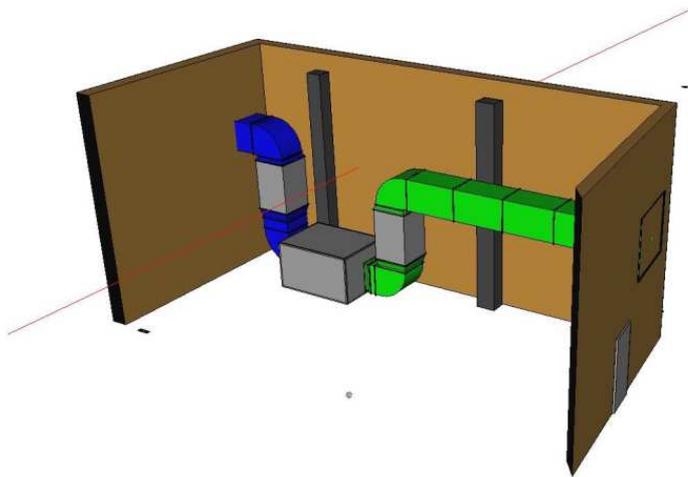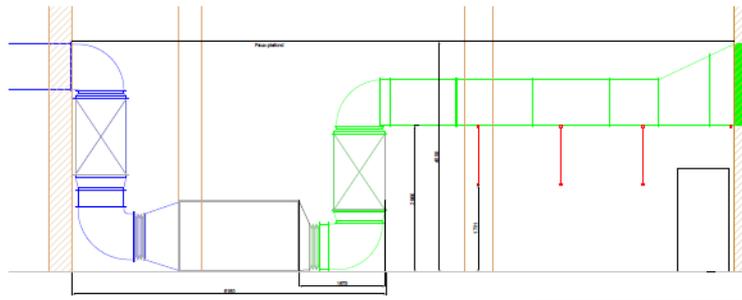



SALLE DE BOXE - GAINE EXTRACTION

La gaine est totalement installée. Il ne manque que le faux plafond à poser par SRC BAT.



STAND DE TIR – GAINES ET CTA

INSUFFLATION STAND DE TIR

Il manque le raccord de l'alcôve à la gaine centrale dans le stand de tir qui sera finalisé d'ici mardi 1 er septembre.



EXTRACTION STAND DE TIR

Il manque le raccord de gaine d'entrée pour rejoindre la CTA, terminé mercredi au plus tard.
Le raccord de sortie de la gaine sera adapté après (le positionnement doit être optimisé avec Mr Chabaud) mais cela ne gênera en aucun cas le fonctionnement.



La gaine centrale est raccordée au mur diffusant haute technologie.



Le faux plafond est au 2/3 fait, le plaquiste a commencé à préparer le dernier tiers mais attend que la gaine centrale totalement finalisée pour terminer.

SPIE a fait des essais d'éclairage pour se rendre compte de la luminosité des pavés LED. L'éclairage en place convient également à Mr Chabaud venu sur site pour se rendre compte.



Mr DI BIANCA, menuiserie du Canal, viendra faire sa protection en bois sur mesure avant l'inauguration. Cette protection permettra d'arrêter les éclats de balles.



La gaine d'air neuf (insufflation) dans le stand de tir sera installée dès que celle de la salle de musculation sera terminée.

NETTOYAGE

La société de nettoyage vient jeudi 3 septembre 8h00 pour faire les salles de boxe et de musculation.

INAUGURATION

Inauguration prévue le samedi 5 septembre à 11h00.
